

工事施工予定週報

【2018年11月12日～2018年11月18日】

工事件名：下高井戸調節池工事のうち（搬出入路設置工事）

受注者：大成・徳倉建設共同企業体


工事期間：2017年12月15日から2023年5月31日のうち（2018年10月2日から2019年10月下旬予定）

監理技術者：木村 誉哉

日付 工種		今週実績							来週予定							再来週予定		
		11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	11/11	11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
搬入路設置 鋼矢板工	中央棧橋ヤード （自転車集積所内）	鋼矢板切断・撤去																
撤去工	下高井戸調節池 （旧野球場・テニスコート内）	残土・As塊・Co塊集積							残土・As塊・Co塊集積									
								フェンス設置・舗装補修										
搬入路設置 鋼矢板工	神田川右岸（学校側） 下流（永福橋方向）	鋼矢板打設工							鋼矢板打設工							鋼矢板打設工		
撤去工	神田川右岸（学校側） 上流（かなな橋方向）	舗装撤去・布掘工							舗装撤去・布掘工							鋼矢板打設工		
管理用通路 通行止め																		
資機材 搬入出予定	昼間（8時～17時） 搬出入	25tRC 1往復	10tトラック 2往復	2tトラック 2往復	2tトラック 2往復	2tトラック 2往復		2tトラック 2往復	2tトラック 2往復	2tトラック 2往復	2tトラック 2往復	2tトラック 2往復			10tトラック 2往復	2tトラック 2往復	2tトラック 2往復	
	夜間（23時～24時） 搬出入	50tRC 搬入	30tトレー 1車搬入		30tトレー 1車搬入			4tトラック 1往復	4tトラック 1往復	4tトラック 1往復	4tトラック 1往復	30tトレー 1車搬出			4tトラック 2往復	30tトレー 1車搬出	4tトラック 2往復	
行事																		
《備考》 ※		今週・・・黒							来週・・・赤							再来週・・・青		

「下高井戸調節池工事に伴う搬出入路工事」の施工状況について

平面図

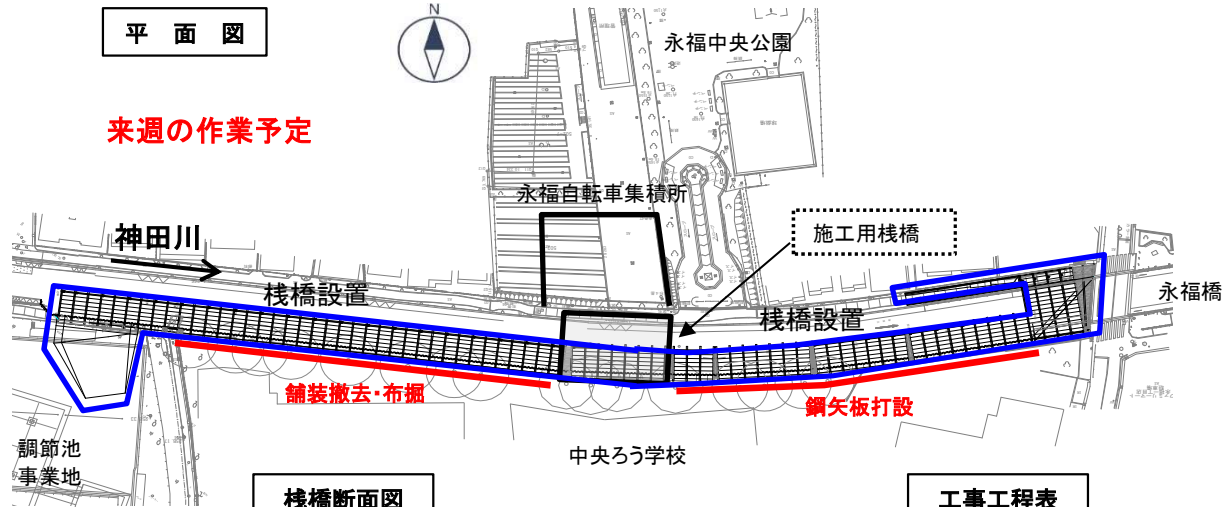


来週の作業予定

工事内容：【搬出入路設置工事】

河川上に搬出入路となる栈橋を構築します。

(鋼矢板打設、護岸取壊し、杭打、栈橋設置他)

栈橋断面図

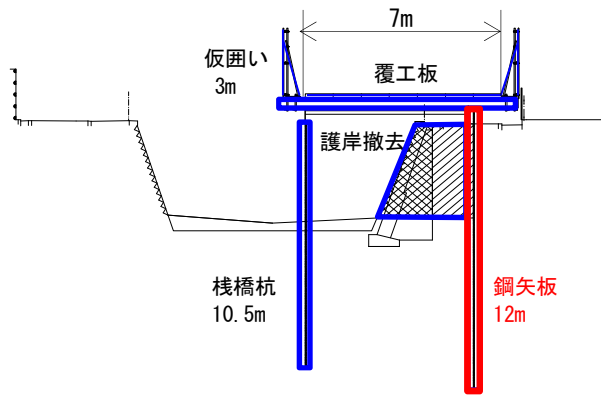


工事工程表

	平成30年			平成31年												
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
仮囲い設置	■															
樹木剪定		■														
舗装撤去・布掘		■	■													
鋼矢板打設工		■	■	■												
護岸撤去・栈橋設置				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
施工用栈橋撤去																
永福自転車集積所片付																
調節池工事(約5年5ヵ月)																●●●●●

通行止めと迂回路

2018年10月15日 ~
調節池工事完了まで

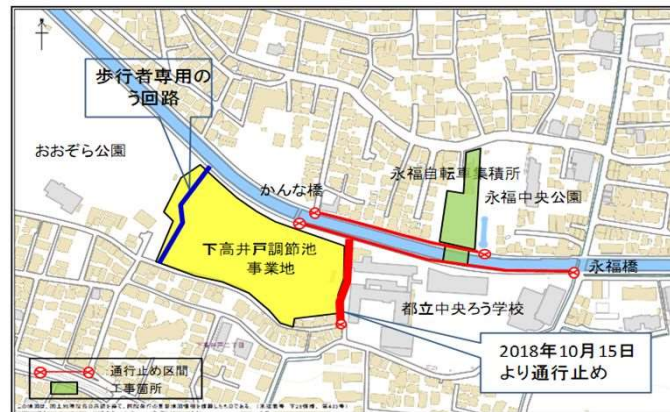

問い合わせ先

施工者：大成・徳倉建設共同企業体
現場代理人 大塚 剛 監理技術者 木村 誉哉
電話番号：03-6304-7380
070-4475-0980 (木村携帯)

発注者：東京都第三建設事務所 工事第二課
担当 岡田、芦田
電話番号：03-3387-6250
