

工事施工予定週報

【2019年 7月 29日 ~ 2019年 8月 4日】

工事件名：下高井戸調節池工事のうち（搬出入路設置工事）

受注者：大成・徳倉建設共同企業体

工事期間：2017年12月15日から2023年 5月31日のうち（2018年10月2日から2019年10月下旬予定）


監理技術者：木村 誉哉

日付		今週実績							来週予定							再来週予定				
		7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7		
工種		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		
土工・掘削工	永福橋付近		掘削工、残土搬出							端部土留工										
				護岸撤去工（右岸側）									仮覆工撤去・埋戻し							
				ワイヤー切断撤去																
			護岸撤去工（左岸側）	音が出ます。										桁受桁設置工					栈橋設置工	
支持杭打設工			ワイヤー切断撤去																	
			BH杭打設工（左岸側）							BH杭打設工				支持杭打設工						
栈橋設置工	調節池付近		掘削工、残土搬出									掘削工、残土搬出								
			護岸撤去取壊し										護岸撤去取壊し							
			音が出ます。																栈橋補強撤去	
							下水吐け口部				下水吐け口部								下水吐け口部	
			ワイヤー切断撤去						ワイヤー切断撤去	音が出ます。								ワイヤー切断撤去		
																		音が出ます。		
永福橋 交通規制（片側交互通行）										永福橋付近 交通規制無し										永福橋付近 交通規制無し
調節池ヤード 残土運搬・仮置・整地		調節池ヤード：残土運搬、ふるい分け																		
資機材搬入出予定	昼間（8時～17時）搬出入	3tトラック10往復 4tトラック2往復 25tRC搬入	3tトラック10往復 4tトラック2往復	3tトラック10往復 4tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復 10tトラック2往復 25tRC搬出	2tトラック2往復 4tトラック2往復 10tトラック2往復 25tRC搬出			2tトラック2往復 4tトラック2往復 10tトラック2往復 25tRC搬入	2tトラック2往復 4tトラック2往復 4tトラック2往復 10tトラック2往復	3tトラック10往復 4tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復 10tトラック1往復 25tRC搬出	2tトラック2往復 4tトラック2往復 10tトラック2往復 15tトラック3往復 25tRC搬入			2tトラック2往復 4tトラック2往復 4tトラック2往復 10tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復 4tトラック2往復 10tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復		
	夜間（23時～24時）搬出入																			
行事							土休日	休日							土休日	休日				

《備考》 ※ 今週・・・黒 来週・・・赤 再来週・・・青

「下高井戸調節池工事に伴う搬出入路工事」の施工状況について

【2019年 7月 29日 ~ 2019年 8月 4日】

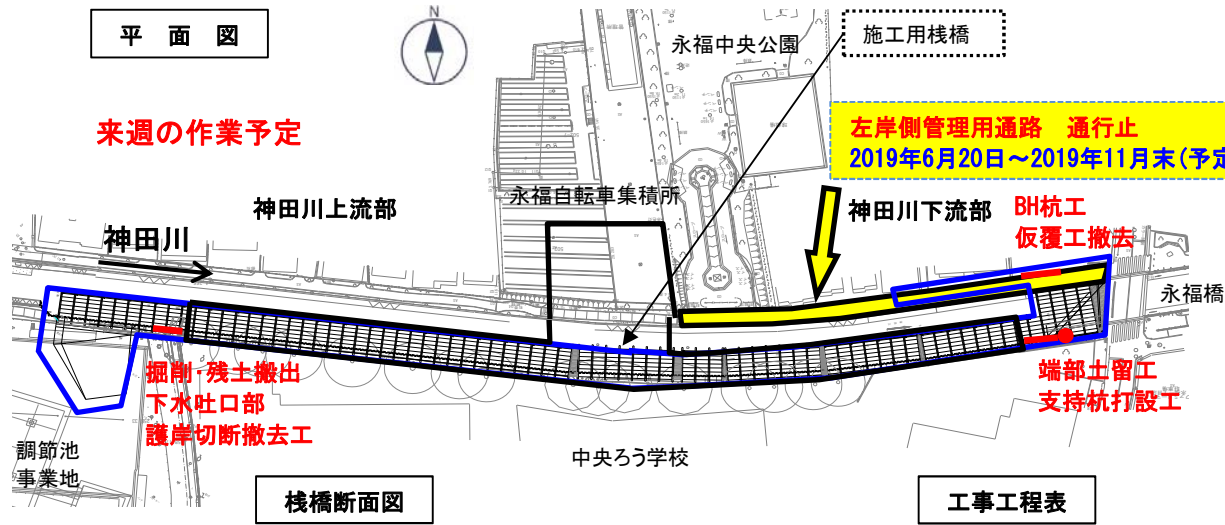

問い合わせ先


施工者：大成・徳倉建設共同企業体
 現場代理人 大塚 剛 監理技術者 木村 誉哉
 電話番号：03-6304-7380
 070-4475-0980 (木村携帯)
 発注者：東京都第三建設事務所 工事第二課
 担当 木村、芦田
 電話番号：03-3387-6250

工事内容：【搬出入路設置工事】

河川上に搬出入路となる栈橋を構築します。

(鋼矢板打設、護岸取壊し、杭打、栈橋設置他)

栈橋断面図

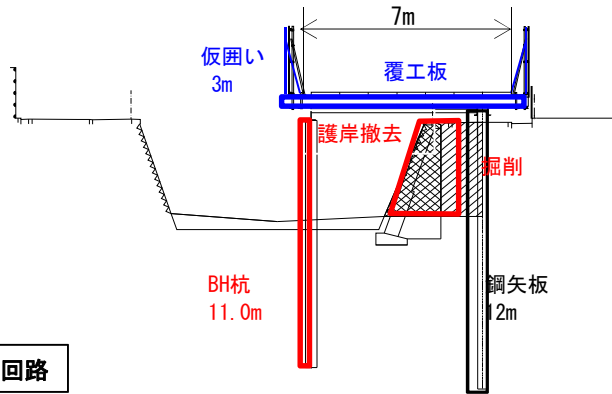

工事工程表

	2018年			2019年												
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
仮囲い設置	■															
樹木剪定		■														
舗装撤去・布堀		■														
鋼矢板打設工			■	■	■											
護岸撤去・栈橋設置				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
施工用栈橋撤去																
永福自転車集積所片付																
調節池工事(約5年5ヵ月)																●



QRコード：問い合わせ先が表示されます。

HPアドレス：<https://simotakaido.com/>

通行止めと迂回路

2019年6月20日(予定) ~ 2019年11月末(予定)まで



現場写真

QRコード
永福橋より撮影



かなな橋より撮影

