

工事施工予定週報

【2019年 9月 23日 ~ 2019年 9月 29日】

工事件名：下高井戸調節池工事のうち（搬出入路設置工事）

受注者：大成・徳倉建設共同企業体

工事期間：2017年12月15日から2023年 12月11日のうち（2018年10月2日から2019年10月下旬予定）


監理技術者：木村 誉哉

工種	日付	今週実績							来週予定							再来週予定				
		9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30	10/1	10/2		
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		
土工・掘削工	永福橋付近			栈橋設置工														永福橋補強工		
					支持杭打設														炭素繊維補強工	
					右岸側	左岸側														
				永福橋補強工		高欄撤去														
支持杭打設工	永福橋 道路交通規制		永福橋付近 片側交通規制							永福橋付近 片側交通規制								永福橋付近 片側交通規制		
	栈橋設置工		掘削工、残土搬出																	
調節池工事	調節池ヤード 残土運搬・仮置・整地		残土運搬・整地							調節池ヤード 乗込知-ﾌﾞ 設置								調節池ヤード 残土搬出・撤去工		
資機材 搬入出予定	昼間（8時～17時） 搬出入		2tトラック2往復 3tトラック10往復 10tトラック2往復 25tRC搬入	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック2往復		2tトラック2往復 3tトラック10往復 10tトラック2往復				2tトラック2往復 4tトラック2往復 10tトラック5往復 15tトラック2往復 25tRC搬入	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復 30tトラック 4台×3回	2tトラック2往復 4tトラック2往復 30tトラック 4台×3回					10tトラック 4台×3回	10tトラック 4台×3回	10tトラック 4台×3回
	早朝（5時～6時） 夜間（23時～24時） 搬出入										早朝搬入 30tトラック BH0.7m3		夜間搬出 30tトラック 杭打機							
行事		敬老の日				土休日	休日	秋分の日						土休日	休日					

《備考》 ※ 今週・・・黒 来週・・・赤 再来週・・・青

「下高井戸調節池工事に伴う搬出入路工事」の施工状況について

【2019年 9月 23日 ~ 2019年 9月 29日】

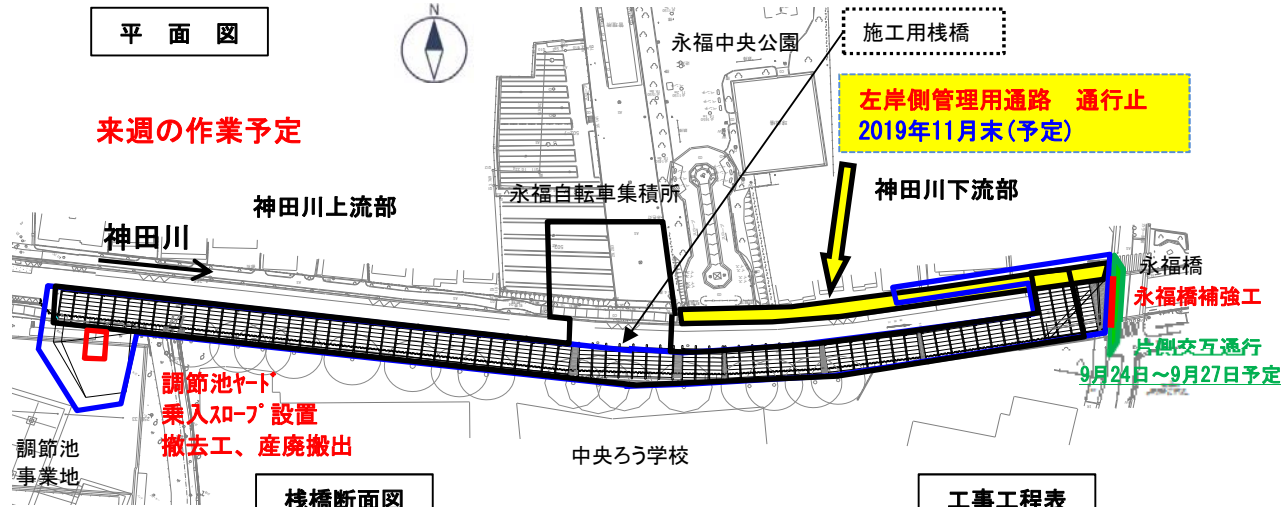

問い合わせ先


施工者：大成・徳倉建設共同企業体
 現場代理人 大塚 剛 監理技術者 木村 誉哉
 電話番号：03-6304-7380
 070-4475-0980 (木村携帯)
 発注者：東京都第三建設事務所 工事第二課
 担当 木村、芦田
 電話番号：03-3387-6250

工事内容：【搬出入路設置工事】

河川上に搬出入路となる栈橋を構築します。


(鋼矢板打設、護岸取壊し、杭打、栈橋設置他)

栈橋断面図

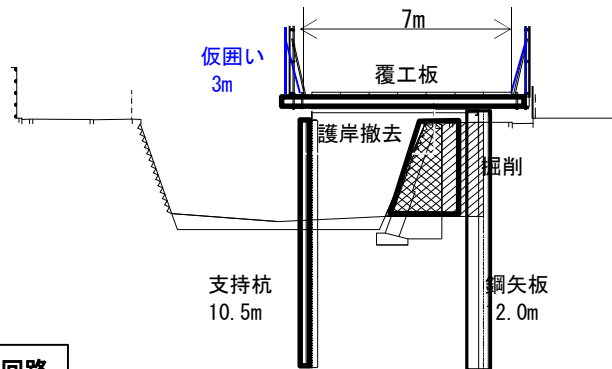

工事工程表

	2018年			2019年												
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
仮囲い設置	■															
樹木剪定		■														
舗装撤去・布堀		■														
鋼矢板打設工		■	■													
護岸撤去・栈橋設置			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
施工用栈橋撤去																
永福自転車集積所片付																
調節池工事(約5年5ヵ月)																●



QRコード：問い合わせ先が表示されます。

HPアドレス：<https://simotakaido.com/>

現場写真

下流側 永福橋を望む



上流側 かなな橋より望む



通行止めと迂回路

2019年6月20日(予定) ~ 2019年11月末(予定)まで

