

# 工事施工予定週報

【2019年11月18日～2019年11月24日】

工事件名：下高井戸調節池工事のうち（搬出入路設置工事）

受注者：大成・徳倉建設共同企業体

工事期間：2017年12月15日から2023年12月11日のうち（2018年10月2日から2019年11月下旬予定）

監理技術者：木村 誉哉


工種	日付	今週実績							来週予定							再来週予定		
		11/11	11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
土工・掘削工	永福橋付近 神田川 下流部			歩道覆工					歩道覆工									
	永福橋 道路交通規制																	
支持杭打設工		掘削・残土搬出							掘削・残土搬出								掘削・残土搬出	
		護岸撤去工							護岸撤去工								護岸撤去工	
栈橋設置工	神田川 中央部	音が出ます。							音が出ます。							音が出ます。		
					栈橋撤去工 音が出ます。										栈橋撤去工 音が出ます。			
					栈橋設置工							栈橋設置工						
			支持杭打工						支持杭引抜き 音が出ます。			支持杭打工					支持杭引抜き 音が出ます。	
調節池工事	調節池ヤード 残土運搬・仮置・整地	調節池ヤード							調節池ヤード									
		残土運搬・集土・整地							残土運搬・集土・整地									
									仮囲い設置工									
									東側 テニスコート									
資機材搬入出予定	昼間（8時～17時） 搬出入	2tトラック2往復 4tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復			2tトラック2往復 4tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復			2tトラック2往復 4tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復	
	早朝（5時～6時） 夜間（23時～24時） 搬出入	3tトラック 2台×10回 25tRC搬入	3tトラック 2台×5回	15tトラック2往復	15tトラック2往復	15tトラック2往復 25tRC搬出			3tトラック 2台×5回 25tRC搬入	3tトラック 2台×10回	3tトラック 2台×5回			15tトラック2往復 25tRC搬出	15tトラック2往復 25tRC搬入	3tトラック 2台×5回	3tトラック 2台×10回	
行事						土休日	休日						土休日	休日				

《備考》 ※ 今週・・・黒 来週・・・赤 再来週・・・青


# 「下高井戸調節池工事に伴う搬出入路工事」の施工状況について

【2019年 11月 18日 ~ 2019年 11月 24日】

平面図

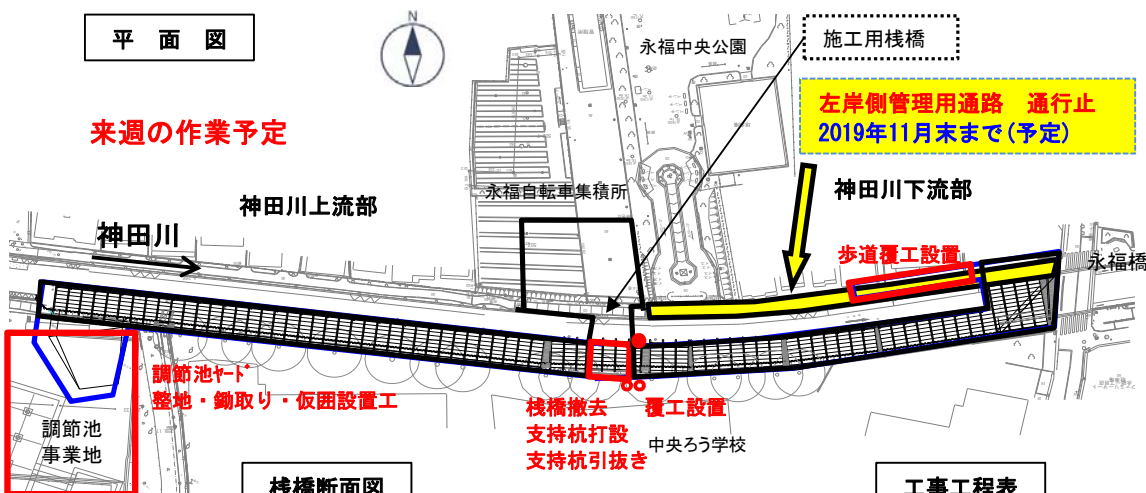

栈橋断面図

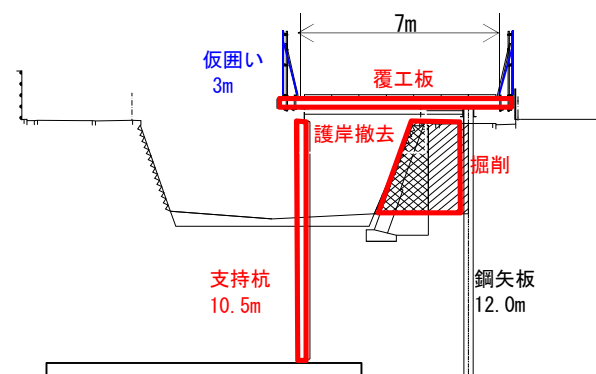


通行止めと迂回路の状況



工事工程表

	2018年			2019年												
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
仮囲い設置	■	■	■													
樹木剪定		■	■													
舗装撤去・布堀		■	■													
鋼矢板打設工		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
護岸撤去・栈橋設置				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
施工用栈橋撤去																
永福自転車集積所片付																
調節池工事(約5年5ヵ月)																



QRコード : 問い合わせ先が表示されます。  
HPアドレス : <https://simotakaido.com/>

## 問い合わせ先

施工者: 大成・徳倉建設共同企業体  
現場代理人 大塚 剛 監理技術者 木村 誉哉  
電話番号: 03-6304-7380  
070-4475-0980 (木村携帯)  
発注者: 東京都第三建設事務所 工事第二課  
担当 木村、芦田  
電話番号: 03-3387-6250

## 工事内容 : 【搬出入路設置工事】

河川上に搬出入路となる栈橋を構築します。

(鋼矢板打設、護岸取壊し、杭打、栈橋設置他)

## 現場写真



QRコード 永福橋を望む

施工用栈橋 上流を望む
