

工事施工予定週報

【2020年2月10日～2020年2月16日】

工事件名：下高井戸調節池工事

受注者：大成・徳倉建設共同企業体

工事期間：2017年12月15日から2023年12月11日

監理技術者：木村 誉哉


日付 工種		今週実績							来週予定							再来週予定		
		2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11	2/12	2/13	2/14	2/15	2/16	2/17	2/18	2/19
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
自転車集積所 復旧工	神田川 中央部	作業無し							作業無し							作業無し		
調節池工事	掘削・残土搬出 セメント改良工 仮設工・場内整備工	一次整地工（掘削・鋤取り）								祝日 休工	作業無し					休日作業		
		残土搬出							コンクリート塊破碎	コンクリート塊搬出						場内土砂運搬		
		音が出ます。							音が出ます。							音が出ます。		
		セメント改良工							セメント改良工							セメント改良工		
	土砂攪拌							土砂攪拌							土砂攪拌			
	仮設工・場内整備工							仮設工・場内整備工							通路整備工（砕石敷均）			
	地中連続壁工													地中連続壁工 重機・資機材搬入				
事務所設置工	事務所設置工				内装工事			事務所設置工				内装工事			事務所設置工 内装工事			
資機材 搬入出予定	昼間（8時～17時） 搬出入	2tトラック2往復 4tトラック2往復 10tトラック 10台×5 15tトラック 4台	2tトラック2往復 4tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復 10tトラック 10台×5回 15tトラック 4台	2tトラック2往復 4tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復 10tトラック 10台×5 15tトラック 4台		2tトラック2往復 4tトラック2往復 10tトラック 10台×5 15tトラック 4台	2tトラック2往復 4tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復		2tトラック2往復 4tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復	
	早朝（5時～6時） 夜間（23時～24時） 搬出入												早朝 5:00 低床トレー 50tRC 夜間23:00 50tRC搬出		早朝 5:00～ 低床トレー 50tRC	早朝 5:00 低床トレー 50tRC	早朝 5:00～ 低床トレー 50tRC搬出	
行事															土休日 休日			
《備考》 ※ 今週・・・黒 来週・・・赤 再来週・・・青																		

下高井戸調節池工事の施工状況について


【2020年 2月 10日 ~ 2020年 2月 16日】

平面図

来週の作業予定

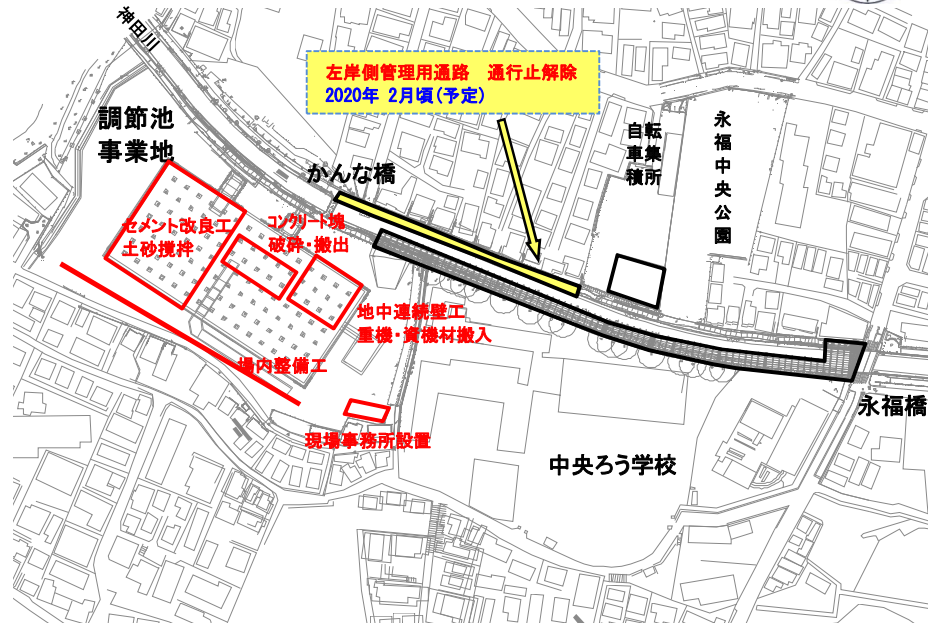

竣工イメージ



問い合わせ先

施工者：大成・徳倉建設共同企業体
 現場代理人 大塚 剛 監理技術者 木村 晋哉
 電話番号：03-6304-7380
 070-4476-0980（木村携帯）
 発注者：東京都第三建設事務所 工事第二課
 担当 木村 晋臣
 電話番号：03-3387-6250

工事内容：【下高井戸調節池工事】

調節池 112.5m×54.5mをコンクリート構造物にて構築します。
 (越流堤・ポンプ槽・排水樋管・坂路 他)

工事工程表

工種	2019年 (令和元年)		2020年 (令和2年)				2021年 (令和3年)				2022年 (令和4年)				2023年 (令和5年)				2024年 (令和6年)			
	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12
準備工		家屋調査																				
地下調節池 導水路 ポンプ槽		支障物 撤去		土留杭 橋橋工		掘削工								構築工								埋戻し
越流堤・排水樋管																						鋼矢板工 構築工 護床工
坂路工																						掘削工 埋戻し
片付工																						鋼矢板工 構築工 掘削工 埋戻し 片付工




QRコード：問い合わせ先が表示されます。
 HPアドレス：<https://simotakaido.com/>

QRコード

現場写真

通行止めと迂回路の状況

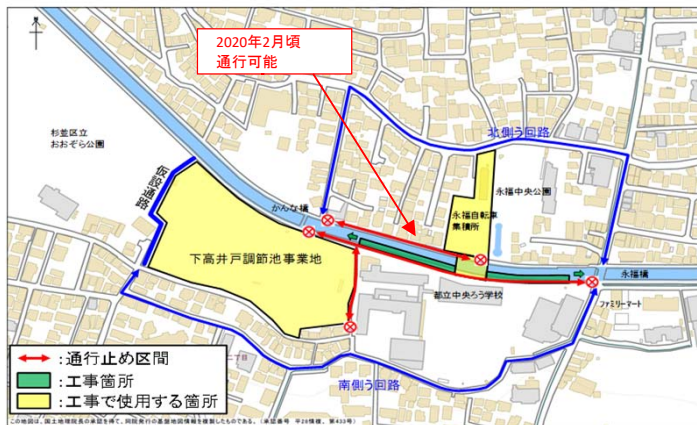

一次整地工 掘削・残土搬出



地盤改良工 土砂攪拌

