

工事施工予定週報

【2020年 6月 22日 ~ 2020年 6月 28日】

工事件名：下高井戸調節池工事

受注者：大成・徳倉建設共同企業体

工事期間：2017年12月15日から2023年 12月11日

監理技術者：木村 誉哉


工 種	日 付	今週実績							来週予定							再来週予定		
		6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30	7/1
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
調節池工事	仮 設 工	仮設工							仮設工							仮設工		
		外周部 手摺・柵設置							外周部 手摺・柵設置							外周部 手摺・柵設置		
		仮設工							仮設工							仮設工		
		排水管設置							排水管設置							排水管設置		
	棧 橋 工	棧橋支持杭工							棧橋支持杭工							棧橋支持杭工		
		資材搬入・プラント設置							支持杭打設							支持杭打設		
	地下水位低下工	北側 スーパーウエル® イト工							西側 スーパーウエル® イト工							東側 スーパーウエル® イト工		
		削孔・スクリーン・ポンプ設置							削孔・スクリーン・ポンプ設置							削孔・スクリーン設置		
		音が出ます。							音が出ます。							音が出ます。		
		南側 スーパーウエル® イト工							西側 スーパーウエル® イト工							東側 スーパーウエル® イト工		
樹木伐採・剪定工	削孔・スクリーン・ポンプ設置							削孔・スクリーン・ポンプ設置							削孔・スクリーン設置			
	音が出ます。							音が出ます。							音が出ます。			
電気設備工	高圧受電設備							高圧受電設備										
	キュービクル設置							建柱・配線										
資機材搬入出予定	昼間(8時~17時)搬入	2tトラック2往復 4tトラック2往復 10tトラック4台 10tDT 2台 25tRC	2tトラック2往復 4tトラック2往復 10tトラック4台 10tDT 2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 10tトラック4台 10tDT 2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 10tトラック4台 10tDT 2台 25tRC×1台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 10tトラック4台 10tDT 2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 10tトラック4台 10tDT 2台 25tRC×3台		2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック2台 25tRC×3台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック2台 25tRC×1台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 10tトラック4台 25tRC×1台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 10tトラック4台 10tDT 2台 25tRC×3台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック2台 25tRC×3台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック2台 10tDT 2台 25tRC×1台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック2台 10tDT 2台 25tRC×1台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 10tトラック4台 10tDT 2台 25tRC×1台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 10tトラック4台 10tDT 2台 25tRC×1台	
	早朝(5時~6時)夜間(21時~)搬入・搬出						早朝 6:00~ 低床トレー RX3500											
行 事						土休日	休 日							土休日	休 日			
《 備 考 》 ※ 今週・・・黒 来週・・・赤 再来週・・・青																		

下高井戸調節池工事の施工状況について


【2020年 6月 22日 ~ 2020年 6月 28日】

来週の作業予定

平面図

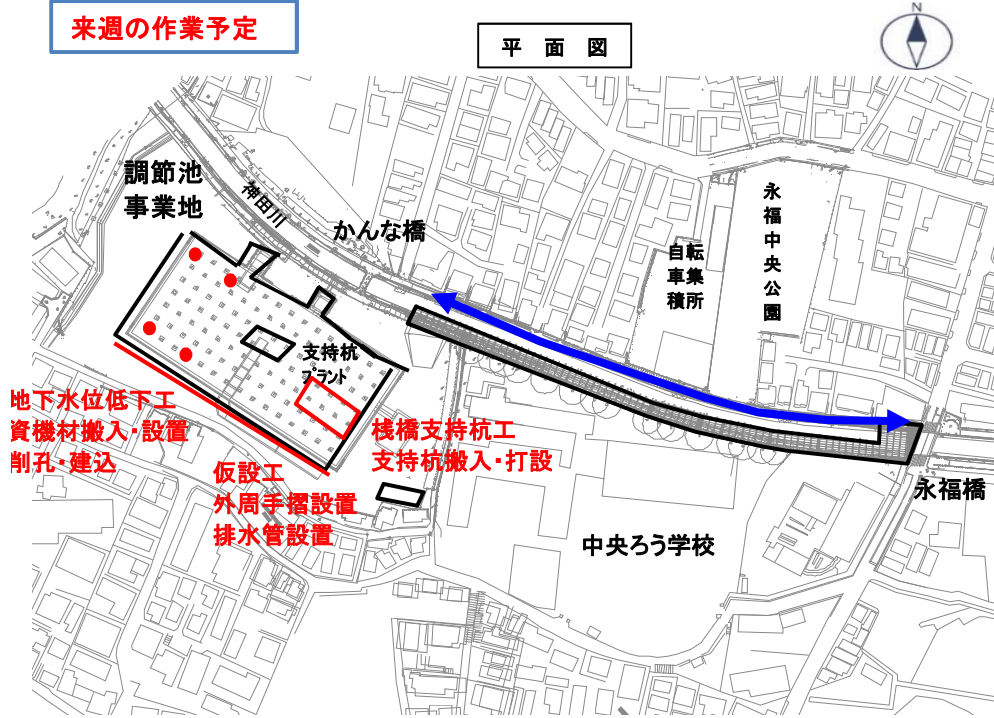

竣工イメージ



問い合わせ先

施工者: 大成・徳倉建設共同企業体
 現場代理人 大塚 剛 監理技術者 木村 誉哉
 電話番号: 03-6304-7380

070-4475-0980 (木村携帯)

発注者: 東京都第三建設事務所 工事第二課
 担当 木村、外山

電話番号: 03-3387-6250


工事内容: 【下高井戸調節池工事】

調節池 112.5m×54.5mをコンクリート構造物にて構築します。
 (越流堤・ポンプ槽・排水樋管・坂路 他)

工事工程表

工種	2019年 (令和元年)			2020年 (令和2年)			2021年 (令和3年)			2022年 (令和4年)			2023年 (令和5年)			2024年 (令和6年)					
	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12			
準備工	家屋調査																				
地下調節池 導水路 ポンプ槽	支障物 撤去			土留杭 棧橋工			掘削工			構築工			埋戻し								
越流堤・排水樋管													鋼矢板工			構築工			護床工		
坂路工													掘削工			構築工			埋戻し		
片付工																片付工					

通行止めと迂回路の状況



QRコード

QRコード: 問い合わせ先が表示されます。
 HPアドレス: <https://simotakaido.com/>

現場写真

地下水位低下工 スーパーウェル・イント施工状況

