

# 工事施工予定週報

【2020年 6月 15日 ~ 2020年 6月 21日】

工事件名：下高井戸調節池工事

受注者：大成・徳倉建設共同企業体

工事期間：2017年12月15日から2023年 12月11日


監理技術者：木村 誉哉

工 種	日 付	今週実績							来週予定							再来週予定			
		6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
調節池工事	仮 設 工								仮設工									仮設工	
										外周部 手摺・柵設置									外周部 手摺・柵設置
	栈 橋 工																		栈橋支持杭工
																			支持杭打設 音が出ます。
	地下水位低下工								スパ-ウエル ｲﾝﾄ工 資機材搬入・荷卸										北側 スパ-ウエル ｲﾝﾄ工
																			削孔・スクリーン設置 音が出ます。
																			南側 スパ-ウエル ｲﾝﾄ工
																			削孔・スクリーン設置 音が出ます。
	地中連続壁工																		
資機材搬入出予定	昼間 (8時~17時) 搬出入	2ﾄﾗｯｸ2往復 4ﾄﾗｯｸ2往復 10ﾄﾗｯｸ3台 10ﾄﾞｲﾄ3台	2ﾄﾗｯｸ2往復 4ﾄﾗｯｸ2往復 10ﾄﾗｯｸ3台 低床ﾄﾚｰ	2ﾄﾗｯｸ2往復 4ﾄﾗｯｸ2往復 10ﾄﾗｯｸ3台 低床ﾄﾚｰ	2ﾄﾗｯｸ2往復 4ﾄﾗｯｸ2往復 10ﾄﾗｯｸ4台 低床ﾄﾚｰ	2ﾄﾗｯｸ2往復 4ﾄﾗｯｸ2往復 10ﾄﾗｯｸ4台 10ﾄﾞｲﾄ3台												2ﾄﾗｯｸ2往復 4ﾄﾗｯｸ2往復 10ﾄﾗｯｸ4台 10ﾄﾞｲﾄ2台 25ﾄﾞｲﾄRC×1台	
	早朝 (5時~6時) 夜間 (21時~ ) 搬入・搬出		夜間搬出 21:00~ 低床ﾄﾚｰ		早朝 6:00~ 50ﾄﾞｲﾄRC 夜間搬出 21:00~ 低床ﾄﾚｰ									早朝 6:00~ 低床ﾄﾚｰ RX3500				早朝 6:00~ 杭材 低床ﾄﾚｰ	
行 事								土休日	休 日									土休日	休 日
《 備 考 》 ※ 今週・・・黒 来週・・・赤 再来週・・・青																			


# 下高井戸調節池工事の施工状況について

【2020年 6月 15日 ~ 2020年 6月 21日】


## 来週の作業予定

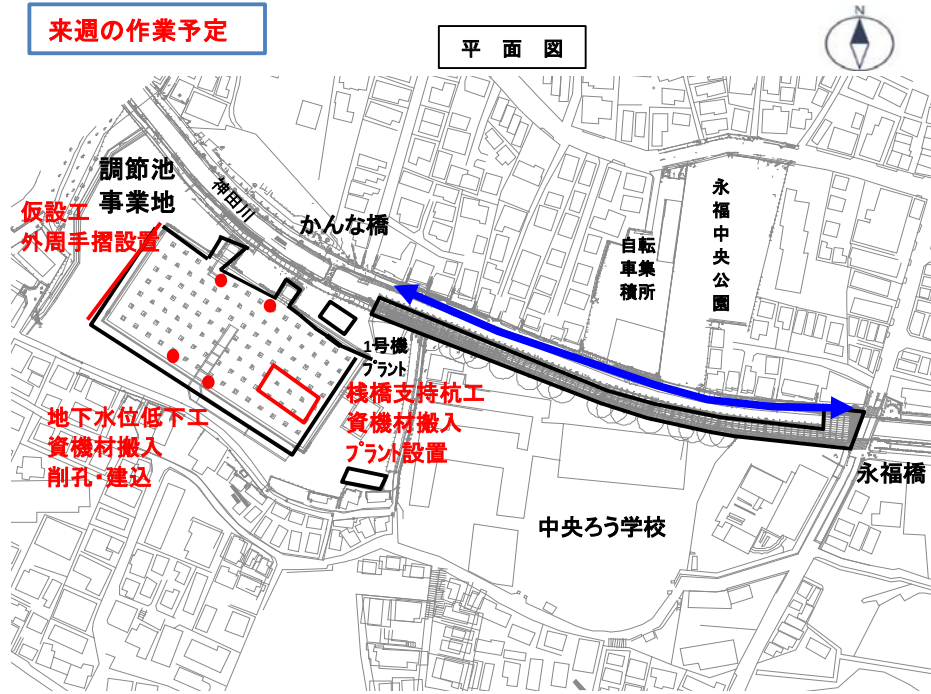

## 通行止めと迂回路の状況

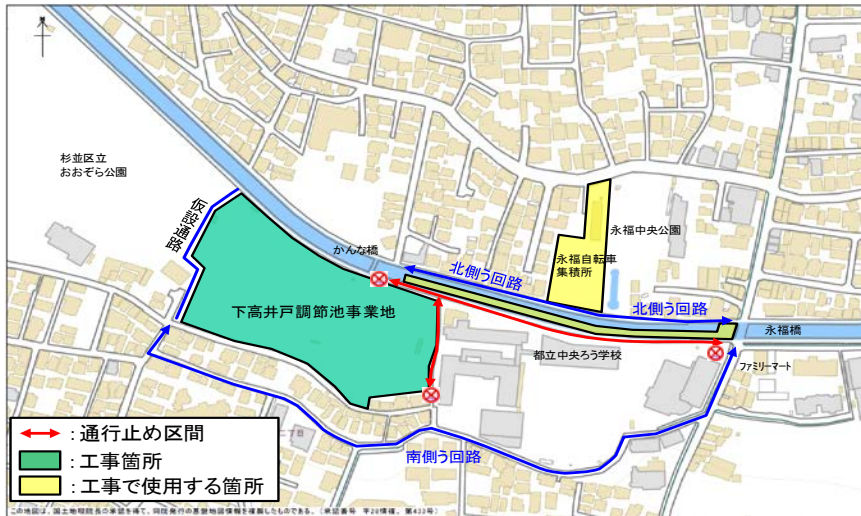

## 竣工イメージ



## 問い合わせ先

施工者: 大成・徳倉建設共同企業体  
 現場代理人 大塚 剛 監理技術者 木村 誉哉  
 電話番号: 03-6304-7380  
 070-4475-0980(木村携帯)  
 発注者: 東京都第三建設事務所 工事第二課  
 担当 木村、外山  
 電話番号: 03-3387-6250

## 工事内容 : 【下高井戸調節池工事】

調節池 112.5m×54.5mをコンクリート構造物にて構築します。  
 (越流堤・ポンプ槽・排水樋管・坂路 他)

## 工事工程表

工種	2019年 (令和元年)		2020年 (令和2年)				2021年 (令和3年)				2022年 (令和4年)				2023年 (令和5年)				2024年 (令和6年)				
	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	
準備工		家屋調査																					
地下調節池 導水路 ポンプ槽		支障物 撤去	土留杭 棧橋工																				
越流堤・排水樋管																							
坂路工																							
片付工																							



QRコード : 問い合わせ先が表示されます。

HPアドレス : <https://simotakaido.com/>

QRコード

## 現場写真

### 地中連続壁工 本体機解体状況

