

工事施工予定週報

【2021年 6月 21日 ~ 2021年 6月 27日】

工事件名：下高井戸調節池工事

工事期間：2017年12月15日から2023年 12月28日

6/23(水) コンクリート打設の為、生コン車の出入りがあります。
大変ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願い致します。

受注者：大成・徳倉建設共同企業体

現場代理人・監理技術者：木村 誉哉


工 種	日 付	今週実績							来週予定							再来週予定		
		6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
調節池工事	仮 設 工 事																	
	鉄 筋 工 事	鉄筋材搬入・荷卸し																
		鉄筋工事 底版配筋 Step2																
		鉄筋工事 底版配筋 Step3																
	型 枠 工 事																	
型枠工事 底版型枠																		
コンクリート工事	底版カーポート打設 底盤Con																	
	コンクリート打設 1,140m3/日 生コン車 10t 268台(予定) 音が出ます。																	
測 量 工																		
	墨出し作業																	
資 機 材 搬入出予定	昼 間 (8時30分~17時) 搬入・搬出	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 生コン車×268台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台 生コン車×268台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台	2tトラック2往復 4tトラック2往復 15tトラック 2台	
	早 朝 (5時~6時) 夜 間 (21時~) 搬入・搬出	早朝搬入 6:00~ 4tトラック×2台	早朝搬入 6:00~ 4tトラック×2台	早朝搬入 6:00~ 4tトラック×1台	早朝搬入 6:00~ 4tトラック×2台	早朝搬入 6:00~ 4tトラック×2台	早朝搬入 6:00~ 4tトラック×2台	早朝搬入 6:00~ 4tトラック×2台	早朝搬入 6:00~ 4tトラック×1台	早朝搬入 6:00~ 4tトラック×2台	早朝搬入 6:00~ 4tトラック×2台	早朝搬入 6:00~ 4tトラック×1台	早朝搬入 6:00~ 4tトラック×1台	早朝搬入 6:00~ 4tトラック×1台	早朝搬入 6:00~ 4tトラック×1台	早朝搬入 6:00~ 4tトラック×1台	早朝搬入 6:00~ 4tトラック×1台	早朝搬入 6:00~ 4tトラック×1台
行 事																		
《 備 考 》		今週・・・黒	来週・・・赤	再来週・・・青														

下高井戸調節池工事の施工状況について

【2021年 6月 21日 ~ 2021年 6月 27日】

来週の作業予定

6/23(水) コンクリート打設の為、生コン車の出入りがあります。
大変ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願い致します。

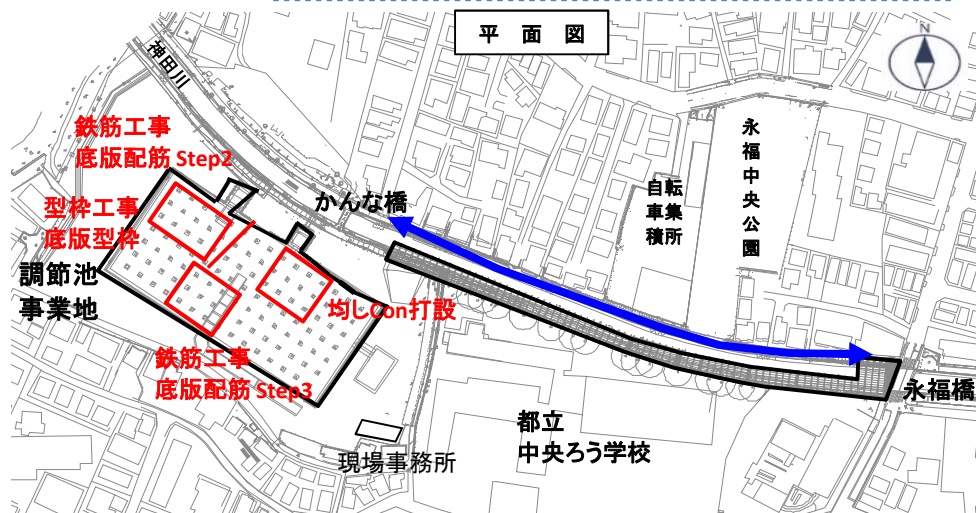


- ・現場の作業時間は、原則 8:00~18:00とする。
- ・工事車両の入退場は、8:30~17:00とする。
- ・工事車両が橋上通路を通行する際は、10km/h以下で走行する。
- ・待機中等の場合は、アイドリングストップを励行して工事を行なう。

通行止めと迂回路の状況



竣工イメージ



問い合わせ先

施工者: 大成・徳倉建設共同企業体

現場代理人・監理技術者 木村 誉哉

電話番号: 03-6304-7380

070-4475-0980 (現場代理人・監理技術者携帯)

発注者: 東京都第三建設事務所 工事第二課

担当 須賀、神戸

電話番号: 03-3228-1419

工事内容 : 【下高井戸調節池工事】

調節池 112.5m×54.5mをコンクリート構造物にて構築します。
(越流堤・ポンプ槽・排水樋管・坂路 他)

工事工程表

工種	2019年度 (令和元年度)			2020年度 (令和2年度)			2021年度 (令和3年度)			2022年度 (令和4年度)			2023年度 (令和5年度)			2024年度 (令和6年度)		
	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12
準備工	家屋調査																	
地下調節池 導水路 ポンプ槽	支障物 撤去			土留杭 仮設構台			掘削工			構築工			埋戻し					
越流堤・排水樋管	鋼矢板工 構築工 護床工 掘削工 埋戻し																	
坂路工	鋼矢板工 構築工 掘削工 埋戻し																	
片付工	片付工																	



QRコード

QRコード : 問い合わせ先が表示されます。

HPアドレス : <https://simotakaido.com/>

現場写真

調節池ヤード 全景

