


下高井戸調節池工事の施工状況について

【2024年 5月 20日 ~ 2024年 5月 26日】

作業状況 平面図

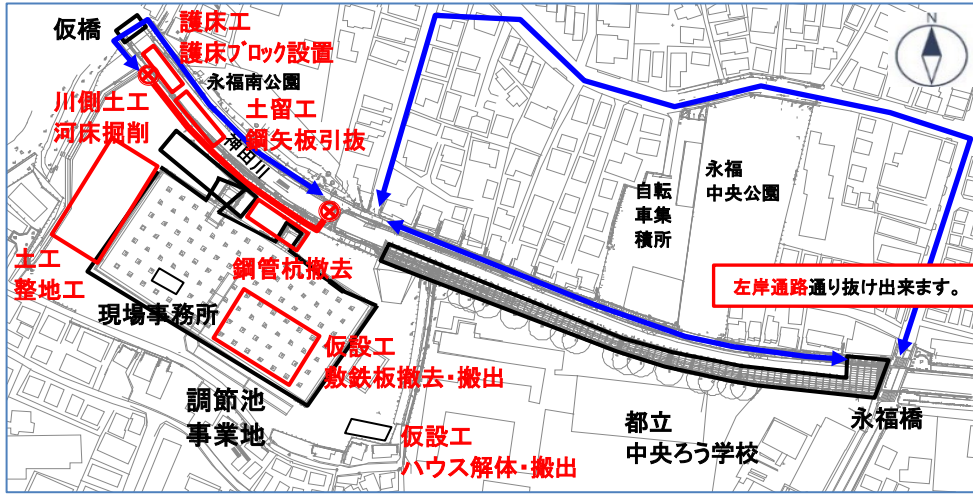


- ・現場の作業時間は、原則 8:00~18:00とする。
- ・工事車両の入退場は、8:30~17:00とする。
- ・工事車両が橋上通路を通行する際は、10km/h以下で走行する。
- ・待機中等の場合は、**アイドリングストップ**を励行して工事を行なう。

通行止めと迂回路の状況



竣工イメージ



問い合わせ先

施工者:大成・徳倉建設共同企業体
現場代理人・監理技術者 木村 誉哉
電話番号:03-6304-7380

070-4475-0980 (現場代理人・監理技術者携帯)

発注者:東京都第三建設事務所 工事第二課

担当 堀部、白澤

電話番号:03-3228-1419

工事内容 : 【下高井戸調節池工事】

調節池 112.5m×54.5mをコンクリート構造物にて構築します。
(越流堤・ポンプ槽・排水樋管)

工事工程表

工種	2019年度 (令和元年度)			2020年度 (令和2年度)			2021年度 (令和3年度)			2022年度 (令和4年度)			2023年度 (令和5年度)			2024年度 (令和6年度)								
	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12						
準備工	家屋調査																							
地下調節池 導水路 ポンプ槽	支障物 撤去			土留杭 仮設構台			掘削工			構築工			埋戻し											
越流堤・排水樋管													鋼矢板工			構築工			護床工					
坂路工													掘削工			鋼矢板工			構築工			埋戻し		
片付工													掘削工			埋戻し			片付工					



QRコード

QRコード : 問い合わせ先が表示されます。

HPアドレス : <https://simotakaido.com/>

現場写真

